ID		Modalità attività	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Pred
1			**ATTIVITA' AMMINISTRATIVA**	**254 g**	**lun 15/04/**	**gio 03/04/**	
2			**Espletamento gara**	**254 g**	**lun 15/04/13**	**gio 03/04/14**	
3			Predisposizione atti di gara e DGR di indizione	78,13 g	lun 15/04/13	gio 01/08/13	
4			Approvazione della DGR di indizione gara	20,13 g	gio 01/08/13	gio 29/08/13	3
5			Pubblicazione del bando di gara	10,13 g	gio 29/08/13	gio 12/09/13	4
6			Presentazione delle offerte	45,13 g	gio 12/09/13	gio 14/11/13	5
7			Nomina della Commissione di valutazione	5,13 g	gio 14/11/13	gio 21/11/13	6
8			Commissione di valutazione - espletamento attività	45,13 g	gio 21/11/13	gio 23/01/14	7
9			Determina di aggiudicazione definitiva	15,13 g	gio 23/01/14	gio 13/02/14	8
10			Richiesta docum e Stipula contratto	35,13 g	gio 13/02/14	gio 03/04/14	9
11			**Espletamento dell'eventuale procedura di "riuso"**	**34,88 g**	**gio 13/02/14**	**gio 03/04/14**	9
12			**CONTRATTO PRIMARIO**	**782 g**	**ven 04/04/14**	**lun 03/04/17**	
13			**Impianto della Base Informativa di riferimento**	**194 g**	**ven 04/04/14**	**mer 31/12/14**	
14			**Messa in esercizio del fascicolo azienc**	25,13 g	ven 04/04/14	ven 09/05/14	10
15			**Integrazione del SIA-RB con il SIR**	**174,13 g**	**gio 01/05/14**	**mer 31/12/14**	
16			Integrzione con l' IMS-AA - Identity Management System - Attribute Autority	23,13 g	ven 02/05/14	mer 04/06/14	10
17			Integrazione con l'infrastruttrua Centrale Bandi	24,13 g	gio 01/05/14	mer 04/06/14	10
18			Integrazione con E-Mail / PEC - Firma Digitale - Marac temporale	25,13 g	gio 05/06/14	gio 10/07/14	17
19			Integrazione con il Portale Basilicatana	37,13 g	gio 10/07/14	lun 01/09/14	18
20			Integrazione con ESB - Enterprise Server Bus	87,75 g	lun 01/09/14	mer 31/12/14	19
21			Integrazione con l'Infrastruttrua R-SDI - Regional Spatial Data Infrastructure	87,75 g	lun 01/09/14	mer 31/12/14	19
22			**Integrazione del SIA-RB con basi dati di altri Enti**	102,88 g	ven 09/05/14	mar 30/09/14	14
23			**Monitoraggio**	**756,88 g**	**ven 09/05/14**	**lun 03/04/17**	
24			Attivazione del modulo informativo del monitoraggio, sui dati esistenti	80,88 g	ven 09/05/14	ven 29/08/14	14
25			Evoluzione del modulo monitoraggio, sui dati dei nuovi moduli informativi	676 g	lun 01/09/14	lun 03/04/17	24
26			**Informatizzazione dei procedimenti amministrativi**	**733,88 g**	**ven 09/05/14**	**mer 01/03/17**	
27			Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020	261 g	mer 01/10/14	mer 30/09/15	22
28			Comparto Vitivinicolo	120 g	lun 01/09/14	ven 13/02/15	
29			Comparto Olivicolo	131 g	mer 01/04/15	mer 30/09/15	
30			Assegnazione di carburante a prezzo agevolato UMA	145,88 g	ven 09/05/14	ven 28/11/14	14
31			Assegnazione indennizzi per danni da calamità naturali	131 g	ven 01/04/16	ven 30/09/16	
32			Comparto zootecnia	130 g	mar 01/09/15	lun 29/02/16	
33			Albo aziende biologiche	131 g	lun 01/06/15	lun 30/11/15	
34			Albo imprenditori agricoli professionali (IAP)	109 g	ven 01/07/16	mer 30/11/16	
35			Inventario usi civici	109 g	sab 01/10/16	mer 01/03/17	
36			Comparto fitosanitario	109 g	lun 01/02/16	gio 30/06/16	
37			Registro "de minimis"	86 g	ven 01/01/16	ven 29/04/16	
38			Registro dei debitori	88 g	sab 01/10/16	mar 31/01/17	
39			**Portale dei servizi in agricoltura**	**756,88 g**	**ven 09/05/14**	**lun 03/04/17**	
40			Attivazione del portale dei Servizi in agricoltura, sui dati esistenti	91,88 g	ven 09/05/14	lun 15/09/14	14
41			Evoluzione del portale dei Servizi in agricoltura, sui dati dei nuovi moduli informativi	665 g	mar 16/09/14	lun 03/04/17	40
42			**Formazione e Comunicazione**	**665 g**	**mar 16/09/14**	**lun 03/04/17**	
43			Attivazione dei moduli informativi / macro attività	665 g	mar 16/09/14	lun 03/04/17	40
44			Evoluzione di Formazione e Comunicazione nelle tre annualità	665 g	mar 16/09/14	lun 03/04/17	
45			**Gestione e manutenzione**	756,88 g	ven 09/05/14	lun 03/04/17	14
46			**CONTRATTO AGGIUNTIVO**	**784 g**	**mar 04/04/17**	**ven 03/04/20**	**45**
47			**Gestione e manutenzione**	784 g	mar 04/04/17	ven 03/04/20	12

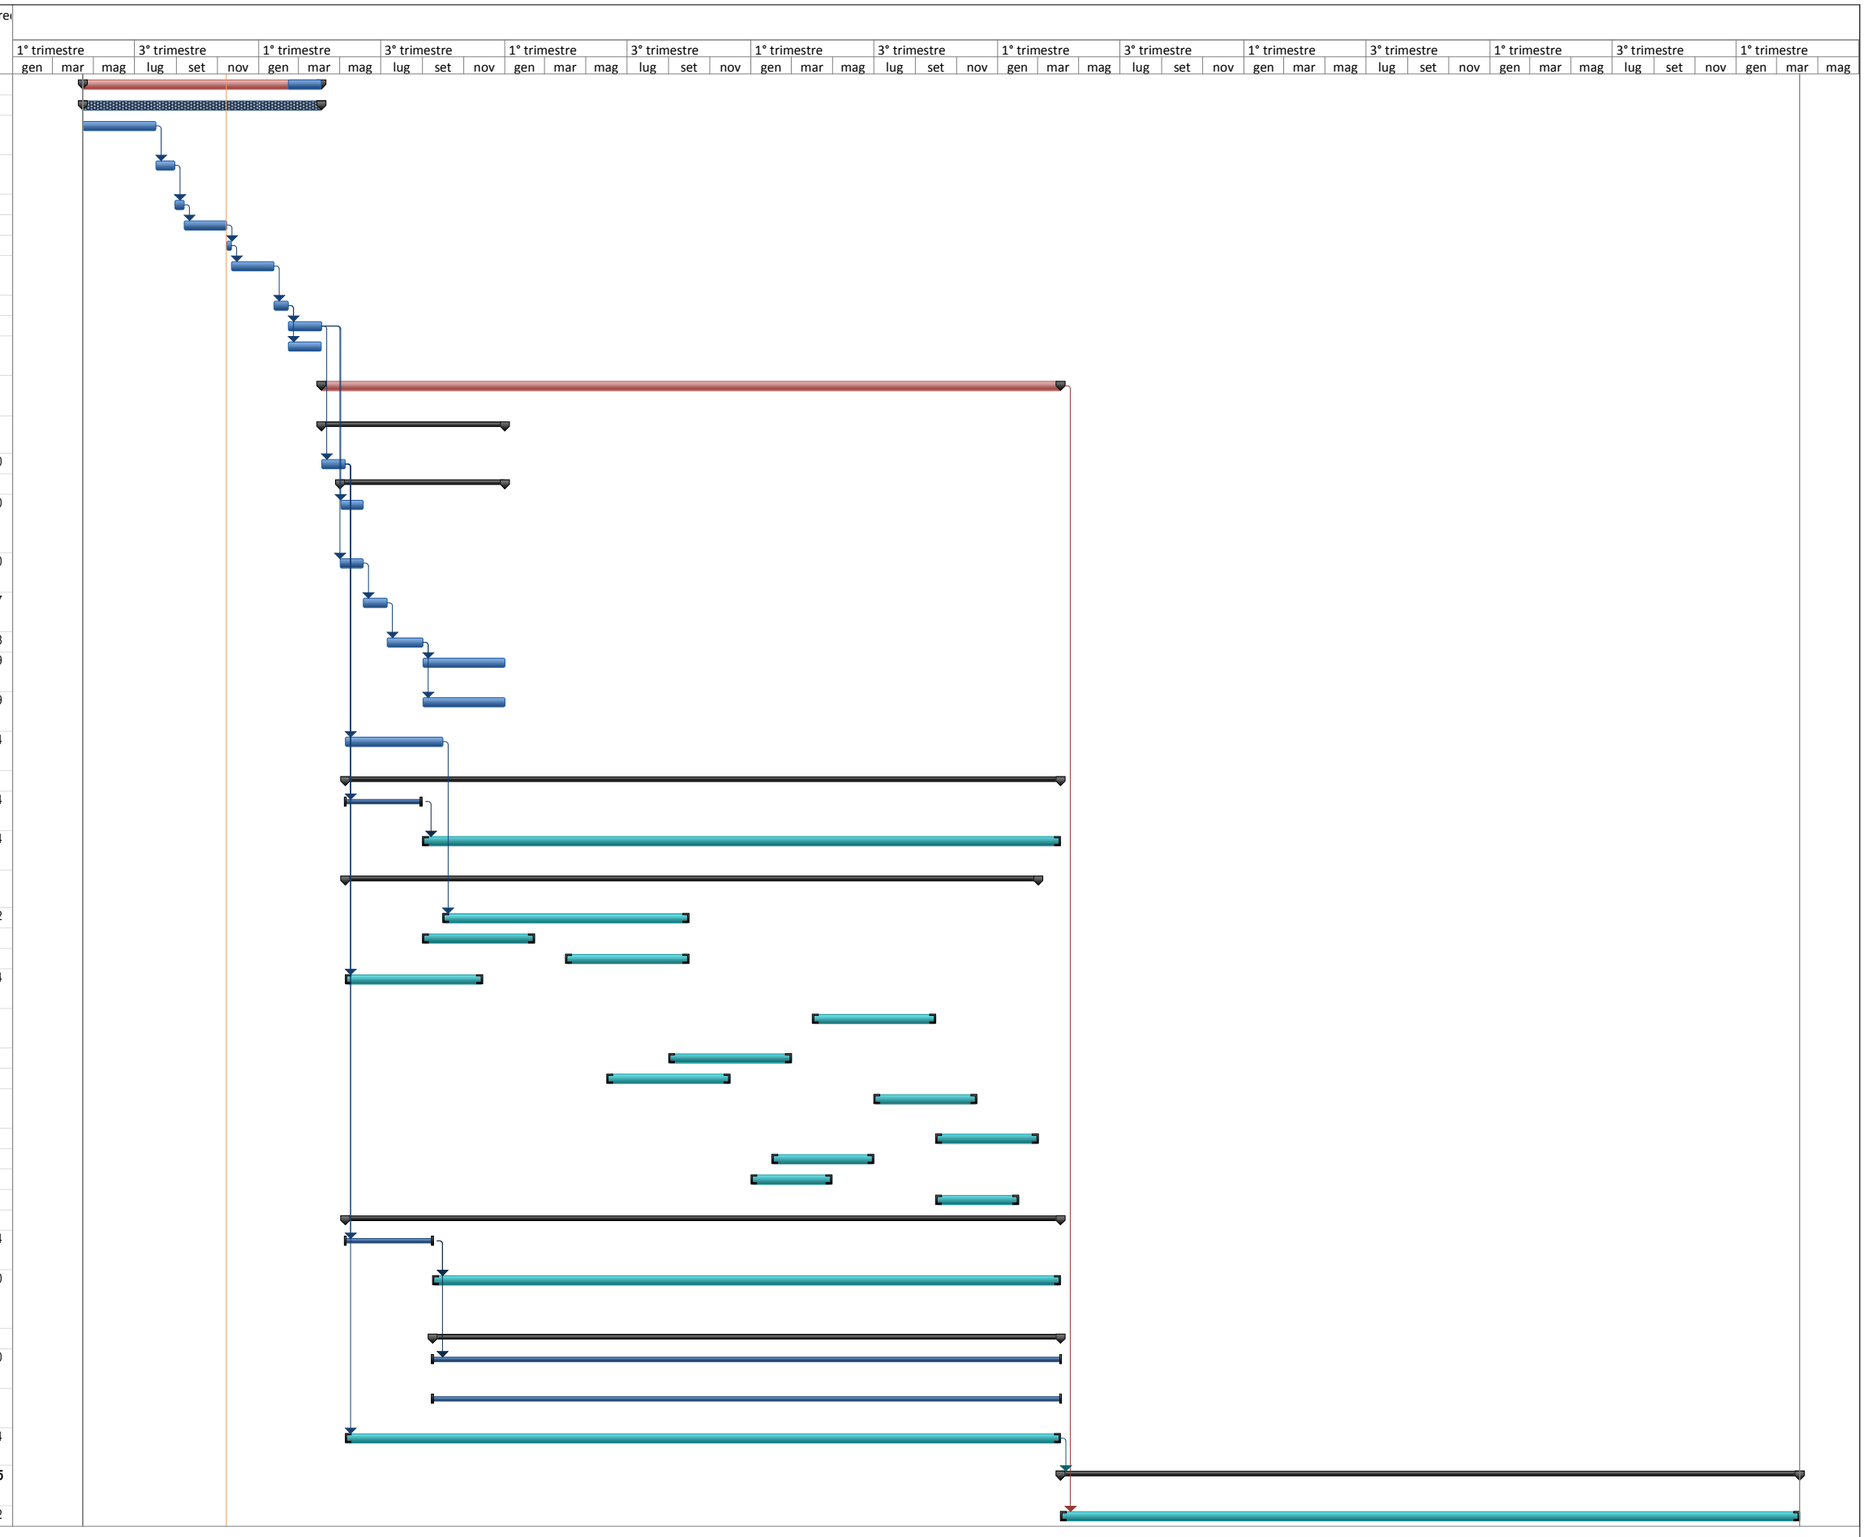

Progetto: 130619_71AM_SIARB 2
Data: gio 14/11/13

Attività	Riepilogo	Cardine esterno	Riepilogo inattiva	Riporto riepilogo manuale	Solo-fine
Divisione	Riepilogo progetto	Attività inattiva	Attività manuale	Riepilogo manuale	Scadenza
Cardine	Attività esterne	Cardine inattiva	Solo-durata	Solo inizio	Avanzamento
